


			RELATÓRIO DE ENSAIO NÃO DESTRUTIVO NDT REPORT ULTRASSOM PHASED ARRAY PHASED ARRAY ULTRASONIC TEST						END				
RELATÓRIO: Report: PA-CS-PALM-07-26			REVISÃO: Revision: 0		PÁGINA: Page: 01/05		PROGRAMAÇÃO: Programming: -		DATA DE INSPEÇÃO: Inspection Date: 26/06/2026				
CLIENTE: Client: RAIZEN ENERGIA S.A			PROJETO: Project: E2G - MONTAGEM ELETROMECAÂNICA				Unidade: Unit: GASA - ANDRADINA - SP						
DESCRIÇÃO: Description: INSPEÇÃO SOLDAS DE TOPO		EQUIPAMENTO: Equipment: -		TAG: Tag: ASC-2-UT-080-CS19-NI		DOCUMENTO DE REF: Reference document: CONFORME ISOMÉTRICO		REVISÃO Review: -		FLUIDO: Fluid: -			
METAL BASE Base Metal: AÇO CARBONO		METAL DE ADIÇÃO Weld Metal: ER70S-3		PROCESSO DE SOLDAGEM Welding Process: GTAW		CONDIÇÕES SUPERFICIAIS Surface Conditions: ESCOVADA/LIXADA							
TÉCNICA Method: PHASED ARRAY		APARELHO / NÚMERO DE SÉRIE Instrument / Serial Number: DOPPLER - Flexscan 32/64 PR		ACOPLANTE Coupling: ÁGUA		ESPESSURA Thickness: 3.91 mm							
CABO COAXIAL Coaxial Handle: 2,5m		BLOCO DE CALIBRAÇÃO Calibration Block: V1		PADRÃO DE REFERÊNCIA Reference Standards: CURVO		SENSIBILIDADE Sensitivity: TCG							
TRANSD./FREQ. (MHz) Transducer/Frequency: 7.5S16-0.5x10		SAPATA Wedge: SD10-N60S-IH	FAIXA DE ÂNGULO Angle Range: 42-70	NÚMERO DE SÉRIE Serial Number: N/A	PITCH/ELEVAÇÃO Pitch/Elevation: 0,5	ELEMENTOS Elements: 16	G. PRINCIPAL Principal Gain: 24,0 dB	G. TRANSF. Transfer Gain: 0	G. VARREDURA Work Gain: 0 dB				
DETALHE DE INSPEÇÃO Inspection Detail: ☐		LAMINADA Laminate: ☐		FORJADO Forged: ☐		FUNDIDO Casting: ☐		SOLDA Weld: ☒		ATT PTT ☐ ☐ SOLDA Weld			
PROCEDIMENTO DE INSPEÇÃO/Rev. Inspection Procedure/Rev.: IT-OB-107 / REV.00					NORMA/CRITÉRIO DE ACEITAÇÃO Code/Acceptance Standards: ASME V / ASME B31.3								
REGISTROS DE RESULTADOS Register of the Results													
ISOMÉTRICO/DESENHO	JUNTA	SPOOL	DIAMETRO	DESC.N°	LOCAL	COMP.	PROF.	SUPERFÍCIE	TIPO DEFEITO	AMPLIT. %	SOLDADOR Welder		LAUDO
isometric	Joint	Spool	Diameter	Desc.n°	Place	Length	Depth	Surface	Defect Type	Amplit. %	Raiz	Enc./Acab.	Result
ASC-2-UT-080-CS19-NI	003	001	2"	-	-	-	-	-	-	-	CIS-078	CIS-078	A
ASC-2-UT-080-CS19-NI	004	001	2"	-	-	-	-	-	-	-	CIS-078	CIS-078	A
ASC-2-UT-080-CS19-NI	005	001	2"	-	-	-	-	-	-	-	CIS-078	CIS-078	A
ASC-2-UT-080-CS19-NI	006	001	2"	-	-	-	-	-	-	-	CIS-078	CIS-078	A
ASC-2-UT-080-CS19-NI	007	001	2"	-	-	-	-	-	-	-	CIS-078	CIS-078	A
ASC-2-UT-080-CS19-NI	008	001	2"	-	-	-	-	-	-	-	CIS-078	CIS-078	A
ASC-2-UT-080-CS19-NI	009	001	2"	-	-	-	-	-	-	-	CIS-078	CIS-078	A
LEGENDA: Legend: A – APROVADO / Approved R – REPROVADO / Rejected REC – RECOMENDADO EXAME COMPLEMENTAR / Recommended Additional Test L1 - LADO 1 / Side 1 L2 - LADO 2 / Side 2 POSI. - POSIÇÃO / Position A.T.T - Antes do tratamento Térmico P.T.T - Pós tratamento térmico													
OBSERVAÇÕES: ENSAIOS REALIZADOS PELO INSPETOR PALMONT. Comments:													
INSPETOR Inspector: Rafael da Silva Faria		APROVAÇÃO Approval: Luis Eduardo de Brito Ferreira					CLIENTE / FISCALIZAÇÃO Client / Surveillance:						
US-N2-PA / ASNT-TC1A N° UT-9092		PALMONT CONSULT. MONT. IND. LTDA Luis Eduardo de Brito Ferreira Coordenador de Qualidade											
DATA / Date: 26/06/26					DATA / Date: 26/06/26					DATA / Date:			


		RELATÓRIO DE ENSAIO NÃO DESTRUTIVO NDT REPORT ULTRASSOM PHASED ARRAY PHASED ARRAY ULTRASONIC TEST			END	
RELATÓRIO: Report: PA-CS-PALM-07-26		REVISÃO: Revision: 0	PÁGINA: Page: 02/05	PROGRAMAÇÃO: -	DATA DE INSPEÇÃO: Inspection Date: 26/06/2026	
CLIENTE: Client: RAIZEN ENERGIA S.A		PROJETO: Project: E2G - MONTAGEM ELETROMECAÂNICA		Unidade: Unit: GASA - ANDRADINA - SP		
DESCRIÇÃO: Description: INSPEÇÃO SOLDAS DE TOPO		DOCUMENTO DE REF: Reference document: CONFORME ISOMÉTRICO		REVISÃO Review: -	FLUIDO: Fluid: -	

IMAGENS
Images

SPOOL-001 JUNTA-003

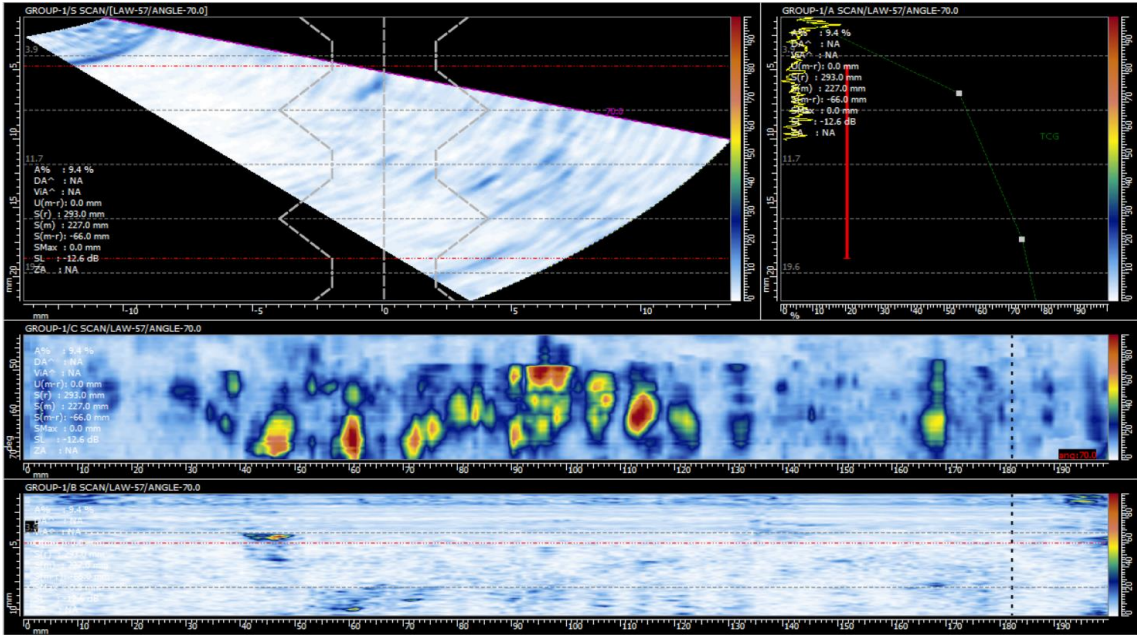

SPOOL-001 JUNTA-004

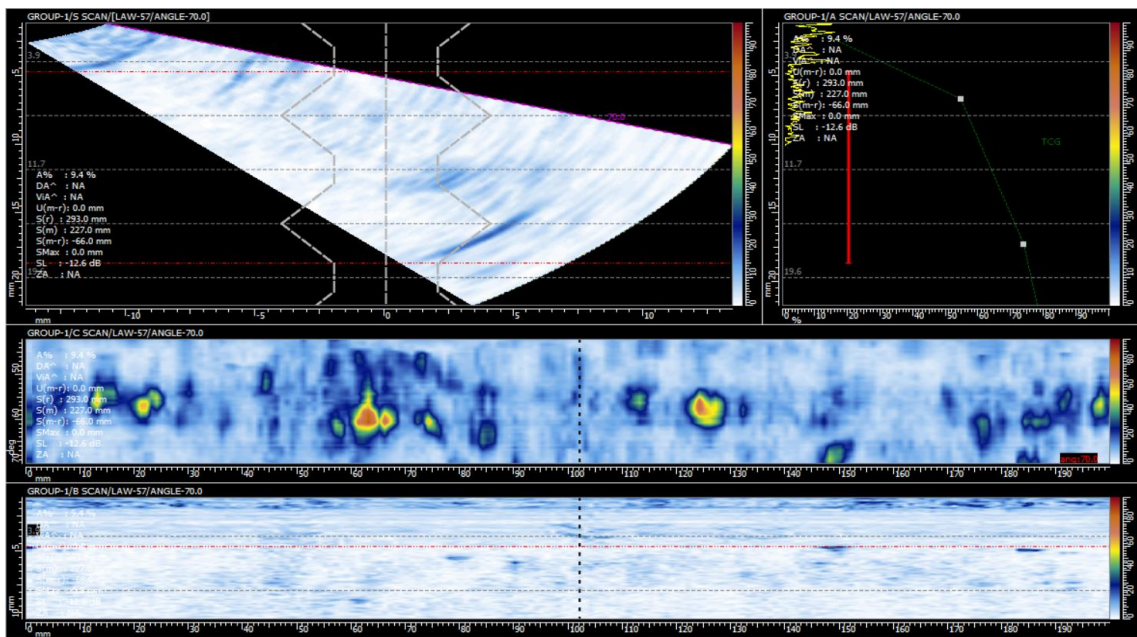


OBSERVAÇÕES:
Comments:

INSPEÇÃO Inspector	APROVAÇÃO Approval	CLIENTE / FISCALIZAÇÃO Client / Surveillance
Rafael da Silva Faria US-N2-PA / ASNT-TC1A N° UT-9092	PALMONT CONST. MONT. IND. LTDA Luiz Eduardo de Brito Ferreira Coordenador de Qualidade	
DATA / Date: 26/06/26	DATA / Date: 26/06/2026	DATA / Date


		RELATÓRIO DE ENSAIO NÃO DESTRUTIVO NDT REPORT ULTRASSOM PHASED ARRAY PHASED ARRAY ULTRASONIC TEST			END	
RELATÓRIO: Report: PA-CS-PALM-07-26		REVISÃO: Revision: 0	PÁGINA: Page: 03/05	PROGRAMAÇÃO: -	DATA DE INSPEÇÃO: Inspection Date: 26/06/2026	
CLIENTE: Client: RAIZEN ENERGIA S.A		PROJETO: Project: E2G - MONTAGEM ELETROMECAÂNICA		Unidade: Unit: GASA - ANDRADINA - SP		
DESCRIÇÃO: Description: INSPEÇÃO SOLDAS DE TOPO		DOCUMENTO DE REF: Reference document: CONFORME ISOMÉTRICO		REVISÃO Review: -	FLUIDO: Fluid: -	

IMAGENS
Images

SPOOL-001 JUNTA-005

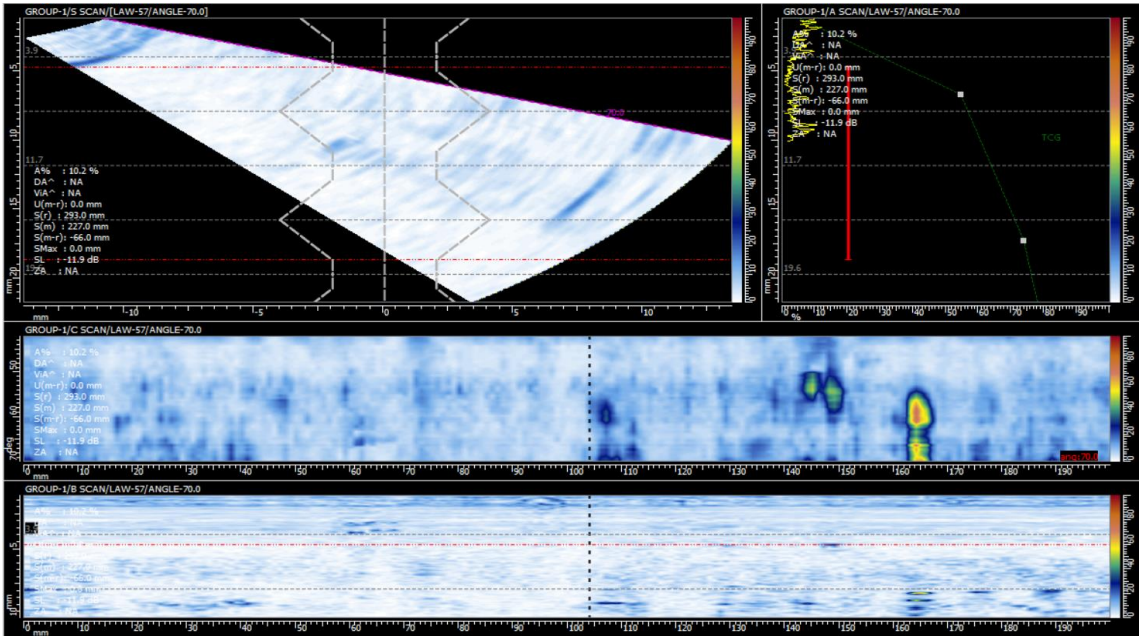

SPOOL-001 JUNTA-006

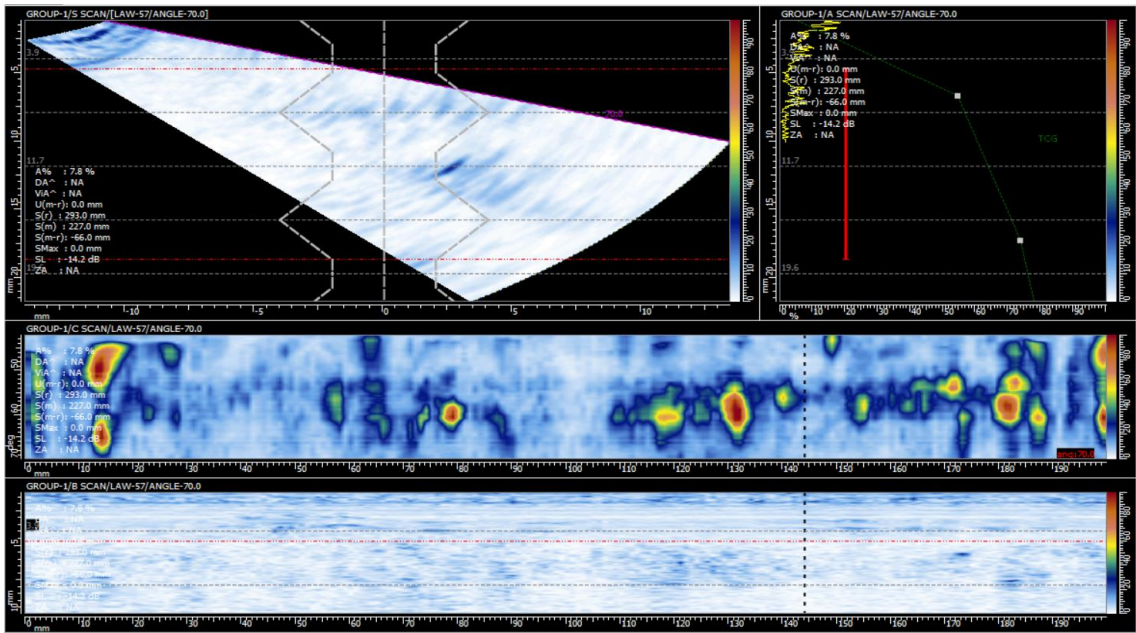


OBSERVAÇÕES:

Comments:		APROVAÇÃO Approval		CLIENTE / FISCALIZAÇÃO Client / Surveillance	
Rafael da Silva Faria US-N2-PA / ASNT-TC1A N° UT-9092		 PALMONT CONST. MONT. IND. LTDA Luis Eduardo de Brito Ferreira Coordenador de Qualidade			
DATA / Date: 26/06/26		DATA / Date: 26/06/2026		DATA / Date	

PALMONT		RELATÓRIO DE ENSAIO NÃO DESTRUTIVO NDT REPORT ULTRASSOM PHASED ARRAY PHASED ARRAY ULTRASONIC TEST			END	
RELATÓRIO: Report: PA-CS-PALM-07-26		REVISÃO: Revision: 0	PÁGINA: Page: 04/05	PROGRAMAÇÃO: -	DATA DE INSPEÇÃO: Inspection Date: 26/06/2026	
CLIENTE: Client: RAIZEN ENERGIA S.A		PROJETO: Project: E2G - MONTAGEM ELETROMECAÂNICA			Unidade: Unit: GASA - ANDRADINA - SP	
DESCRIÇÃO: Description: INSPEÇÃO SOLDAS DE TOPO		DOCUMENTO DE REF: Reference document: CONFORME ISOMÉTRICO		REVISÃO Review: -	FLUIDO: Fluid: -	

IMAGENS
Images

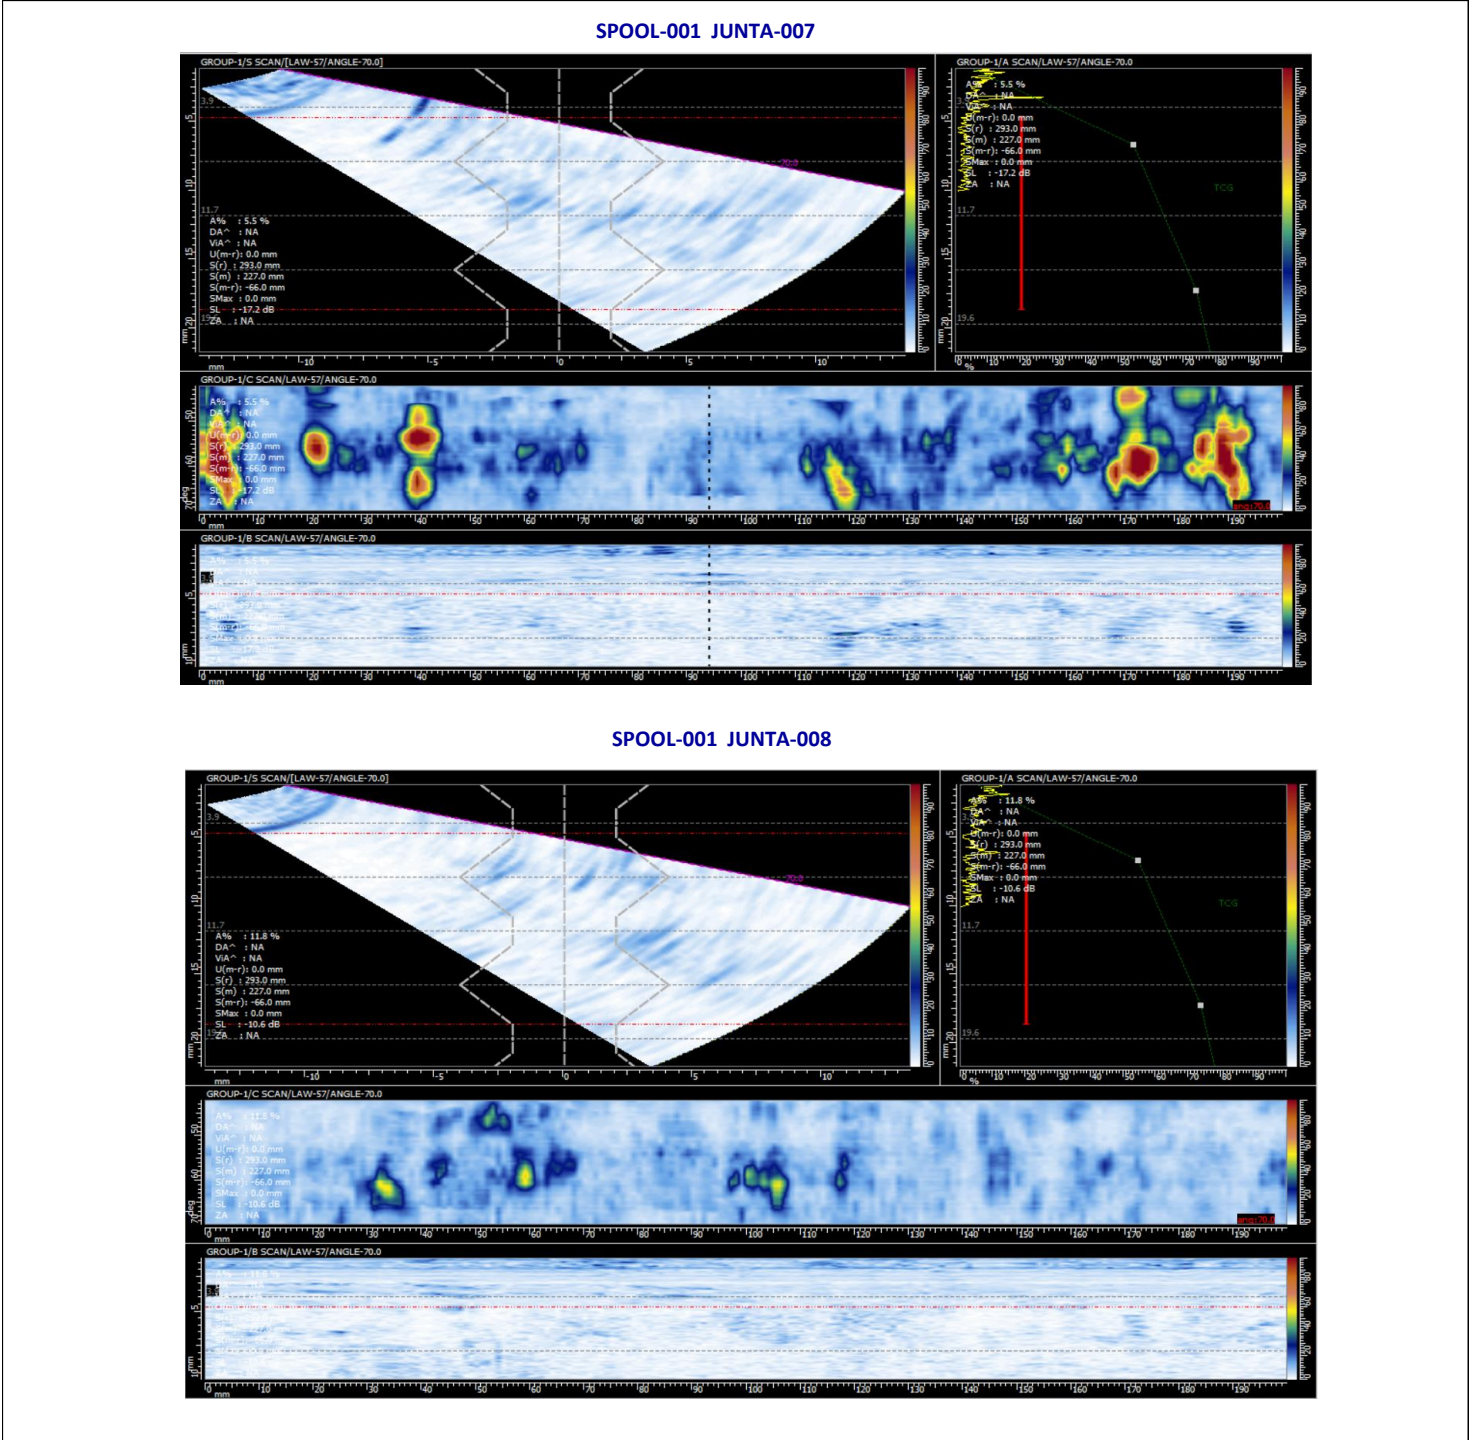

OBSERVAÇÕES:
Comments:

INSPEÇÃO Inspector	APROVAÇÃO Approval	CLIENTE / FISCALIZAÇÃO Client / Surveillance
Rafael da Silva Faria US-N2-PA / ASNT-TC1A N° UT-9092	PALMONT CONST. MONT. IND. LTDA Luiz Eduardo de Brito Ferreira Coordenador de Qualidade	
DATA / Date: 26/06/26	DATA / Date: 26/06/2026	DATA / Date

RELATÓRIO DE ENSAIO NÃO DESTRUTIVO NDT REPORT ULTRASSOM PHASED ARRAY PHASED ARRAY ULTRASONIC TEST		END			
RELATÓRIO: PA-CS-PALM-07-26		REVISÃO: 0	PÁGINA: 05/05	PROGRAMAÇÃO: -	DATA DE INSPEÇÃO: 26/06/2026
CLIENTE: RAIZEN ENERGIA S.A		PROJETO: E2G - MONTAGEM ELETROMECAÂNICA		Unidade: GASA - ANDRADINA - SP	
DESCRIÇÃO: INSPEÇÃO SOLDAS DE TOPO		DOCUMENTO DE REF: CONFORME ISOMÉTRICO		REVISÃO: -	FLUIDO: -
IMAGENS Images					
SPOOL-001 JUNTA-009					
GROUP-1/S SCAN (LAW-57/ANGLE-70.0) A% : 9.4 % DA : NA VIA : NA U(m-r) : 0.0 mm S(r) : 293.0 mm S(m) : 227.0 mm S(m-r) : -66.0 mm SMax : 0.0 mm SL : -12.6 dB ZA : NA GROUP-1/A SCAN (LAW-57/ANGLE-70.0) A% : 9.4 % DA : NA VIA : NA U(m-r) : 0.0 mm S(r) : 293.0 mm S(m) : 227.0 mm S(m-r) : -66.0 mm SMax : 0.0 mm SL : -12.6 dB ZA : NA GROUP-1/C SCAN (LAW-57/ANGLE-70.0) A% : 9.4 % DA : NA VIA : NA U(m-r) : 0.0 mm S(r) : 293.0 mm S(m) : 227.0 mm S(m-r) : -66.0 mm SMax : 0.0 mm SL : -12.6 dB ZA : NA GROUP-1/B SCAN (LAW-57/ANGLE-70.0) A% : 9.4 % DA : NA VIA : NA U(m-r) : 0.0 mm S(r) : 293.0 mm S(m) : 227.0 mm S(m-r) : -66.0 mm SMax : 0.0 mm SL : -12.6 dB ZA : NA					
OBSERVAÇÕES:					
Comments:					
INSPEÇÃO		APPROVAÇÃO		CLIENTE / FISCALIZAÇÃO	
Inspector		Approval		Client / Surveillance	
Rafael da Silva Faria US-N2-PA / ASNT-TC1A N° UT-9092		 PALMONT CONST. MONT. IND. LTDA Luis Eduardo de Brito Ferreira Coordenador de Qualidade			
DATA / Date: 26/06/26		DATA / Date: 26/06/2026		DATA / Date	
