

			RELATÓRIO DE ENSAIO NÃO DESTRUTIVO NDT REPORT ULTRASSOM PHASED ARRAY PHASED ARRAY ULTRASONIC TEST							END			
RELATÓRIO: Report: US-FAB-PA-158 CLIENTE: Client: RAIZEN ENERGIA S.A			REVISÃO: Revision: 0		PÁGINA: Page: 01/03		PROGRAMAÇÃO: Programming: -		DATA DE INSPEÇÃO: Inspection Date: 24/06/2026				
			PROJETO: Project: E2G - MONTAGEM ELETROMECAÂNICA		Unidade: Unit: GASA - ANDRADINA - SP								
DESCRIÇÃO: Description: INSPEÇÃO SOLDAS DE TOPO			EQUIPAMENTO: Equipment: -		TAG: Tag: FBK-6-SL-147-S02-NI		DOCUMENTO DE REF: Reference document: CONFORME ISOMÉTRICO		REVISÃO Review: -		FLUIDO: Fluid: -		
METAL BASE Base Metal: AÇO INOX 304L			METAL DE ADIÇÃO Weld Metal: ER308L			PROCESSO DE SOLDAGEM Welding Process: GTAW			CONDIÇÕES SUPERFICIAIS Surface Conditions: ESCOVADA/LIXADA				
TÉCNICA Method: PHASED ARRAY			APARELHO / NÚMERO DE SÉRIE Instrument / Serial Number: DOPPLER - Flexscan 32/64 PR			ACOPLANTE Coupling: ÁGUA			ESPESSURA Thickness: 3,4 mm				
CABO COAXIAL Coaxial Handle: 2,5m			BLOCO DE CALIBRAÇÃO Calibration Block: V1			PADRÃO DE REFERENCIA Reference Standards: CURVO			SENSIBILIDADE Sensitivity: TCG				
TRANSD./FREQ. (MHz) Transducer/Frequency: 7.5S16-0.5x10		SAPATA Wedge: SD10-N60S-IH	FAIXA DE ÂNGULO Angle Range: 42-70		NÚMERO DE SÉRIE Serial Number: N/A		PITCH/ELEVAÇÃO Pitch/Elevation: 0,5	ELEMENTOS Elements: 16	G. PRINCIPAL Principal Gain: 17,0 dB	G. TRANSF. Transfer Gain: 0	G. VARREDURA Work Gain: 0 dB		
DETALHE DE INSPEÇÃO Inspection Detail		☐ LAMINADA Laminate	☐ FORJADO Forged		☐ FUNDIDO Casting		☒ SOLDA Weld		☒ A.T.T	☐ P.T.T	SOLDA Weld		
PROCEDIMENTO DE INSPEÇÃO/Rev. Inspection Procedure/Rev.: IT-OB-106 / REV.00							NORMA/CRITÉRIO DE ACEITAÇÃO Code/Acceptance Standards: ASME V / ASME B31.3						
REGISTROS DE RESULTADOS Register of the Results													
ISOMÉTRICO/DESENHO	JUNTA	SPOOL	DIAMETRO	DESC.Nº	LOCAL	COMP.	PROF.	SUPERFÍCIE	TIPO DEFEITO	AMPLIT. %	SOLDADOR Welder		LAUDO
isometric	Joint	Spool	Diameter	Desc.nº	Place	Length	Depth	Surface	Defect Type	Amplit. %	Raiz	Enc./Acab.	Result
FBK-6-SL-147-S02-NI	002	001	6"	-	-	-	-	-	-	-	P-1637	P-1637	A
FBK-6-SL-147-S02-NI	003	001	6"	-	-	-	-	-	-	-	P-1637	P-1637	A
FBK-6-SL-147-S02-NI	004	001	6"	-	-	-	-	-	-	-	P-1637	P-1637	A
FBK-6-SL-147-S02-NI	005	002	6"	-	-	-	-	-	-	-	P-1838	P-1838	A
LEGENDA: Legend: A – APROVADO / Approved R – REPROVADO / Rejected REC – RECOMENDADO EXAME COMPLEMENTAR / Recommended Additional Test L1 - LADO 1 / Side 1 L2 - LADO 2 / Side 2 POSI.- POSIÇÃO / Position A.T.T - Antes do tratamento Térmico P.T.T - Pós tratamento térmico													
OBSERVAÇÕES: Comments:													
INSPETOR Inspector Reginaldo Ferreira da Silva US-N2-PA / SNQC-03414				APROVAÇÃO Approval 				CLIENTE / FISCALIZAÇÃO Client / Surveillance					
DATA / Date: 24/06/26				DATA / Date: 24/04/26				DATA / Date					




RELATÓRIO DE ENSAIO NÃO DESTRUTIVO
NDT REPORT
ULTRASSOM PHASED ARRAY
PHASED ARRAY ULTRASONIC TEST

END


RELATÓRIO: Report:	US-FAB-PA-158	REVISÃO: Revision:	0	PÁGINA: Page:	02/03	PROGRAMAÇÃO:	-	DATA DE INSPEÇÃO: Inspection Date:	24/06/2026
CLIENTE: Client:	RAIZEN ENERGIA S.A	PROJETO: Project:	E2G - MONTAGEM ELETROMECAÂNICA			Unidade: Unit:	GASA - ANDRADINA - SP		
DESCRIÇÃO: Description:	INSPEÇÃO SOLDAS DE TOPO	DOCUMENTO DE REF: Reference document:	CONFORME ISOMÉTRICO			REVISÃO Review	-	FLUIDO: Fluid:	-

IMAGENS
Images

SPOOL-001 JUNTA-002

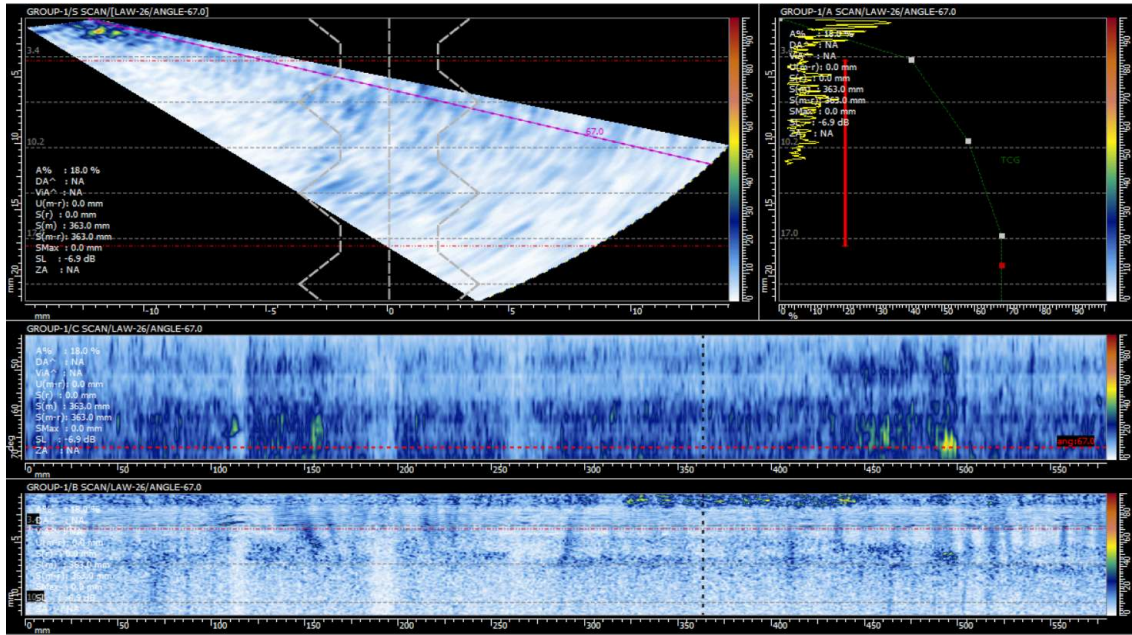

SPOOL-001 JUNTA-003

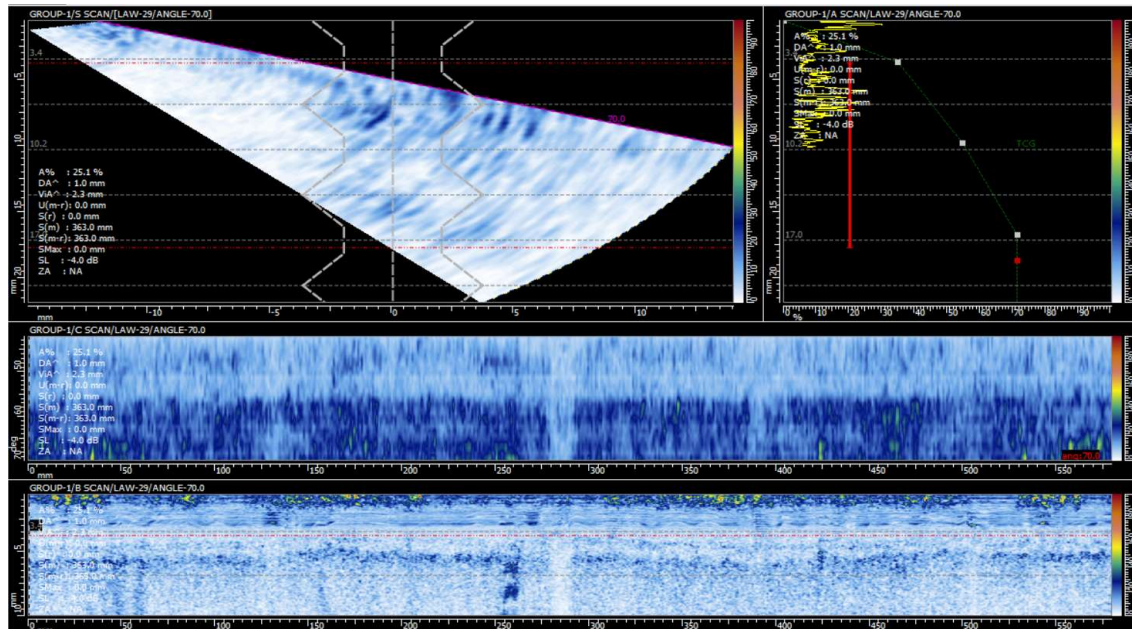

OBSERVAÇÕES: Comments:			APROVAÇÃO Approval		CLIENTE / FISCALIZAÇÃO Client / Surveillance
INSPEÇÃO Inspector			APPROVAL		CLIENT / SURVEILLANCE
Reginaldo Ferreira da Silva US-N2-PA / SNQC-03414			PALMONT CONST. MONT. IND. LTDA Luiz Eduardo de Brito Ferreira Coordenador de Qualidade		
DATA / Date: 24/06/26			DATA / Date: 24/06/26		DATA / Date




RELATÓRIO DE ENSAIO NÃO DESTRUTIVO
NDT REPORT
ULTRASSOM PHASED ARRAY
PHASED ARRAY ULTRASONIC TEST

END


RELATÓRIO: Report:	US-FAB-PA-158	REVISÃO: Revision:	0	PÁGINA: Page:	03/03	PROGRAMAÇÃO:	-	DATA DE INSPEÇÃO: Inspection Date:	24/06/2026
CLIENTE: Client:	RAIZEN ENERGIA S.A	PROJETO: Project:	E2G - MONTAGEM ELETROMECAÂNICA			Unidade: Unit:	GASA - ANDRADINA - SP		
DESCRIÇÃO: Description:	INSPEÇÃO SOLDAS DE TOPO	DOCUMENTO DE REF: Reference document:	CONFORME ISOMÉTRICO			REVISÃO Review	-	FLUIDO: Fluid.	-

IMAGENS
Images

SPOOL-001 JUNTA-004

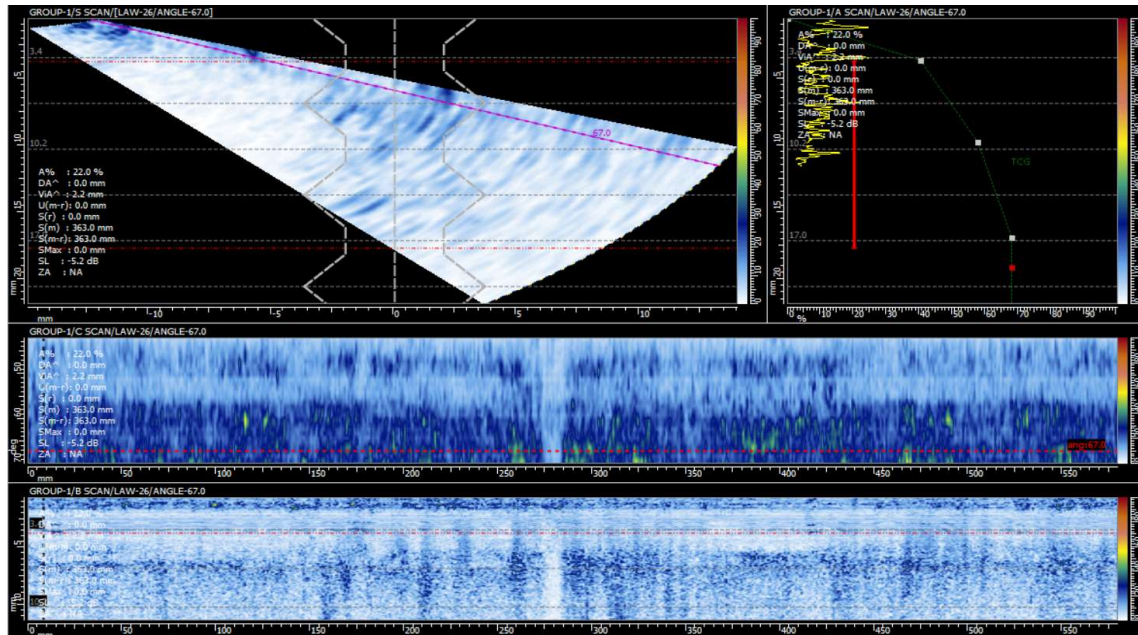

SPOOL-002 JUNTA-005

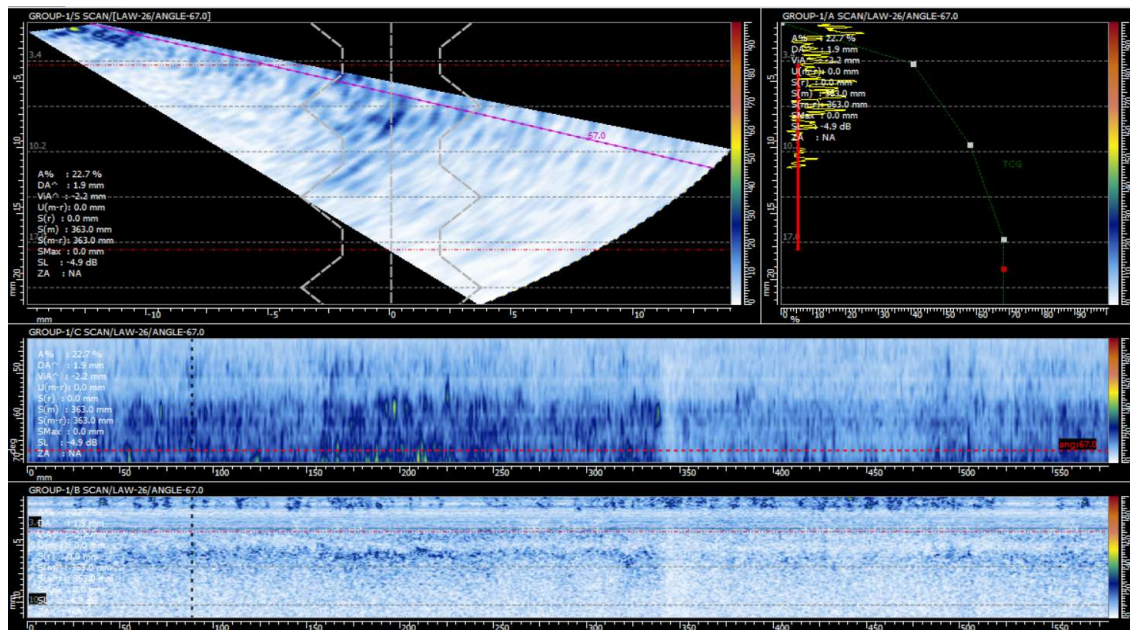

OBSERVAÇÕES:

Comments:	INSPECTOR Inspector Reginaldo Ferreira da Silva US-N2-PA / SNQC-03414	APROVAÇÃO Approval PALMONT CONST. MONT. IND. LTDA Luiz Eduardo de Brito Ferreira Coordenador de Qualidade	CLIENTE / FISCALIZAÇÃO Client / Surveillance
DATA / Date:	24/06/26	DATA / Date:	24/06/26
