

			RELATÓRIO DE ENSAIO NÃO DESTRUTIVO NDT REPORT ULTRASSOM PHASED ARRAY PHASED ARRAY ULTRASONIC TEST							END																
RELATÓRIO: Report: US-FAB-PA-160			REVISÃO: Revision: 0		PÁGINA: Page: 01/02		PROGRAMAÇÃO: Programming: -		DATA DE INSPEÇÃO: Inspection Date: 24/06/2026																	
CLIENTE: Client: RAIZEN ENERGIA S.A			PROJETO: Project: E2G - MONTAGEM ELETROMECÂNICA			Unidade: Unit: GASA - ANDRADINA - SP																				
DESCRIÇÃO: Description: INSPEÇÃO SOLDAS DE TOPO		EQUIPAMENTO: Equipment: -		TAG: Tag: FBK-6-SL-148-S02-NI		DOCUMENTO DE REF: Reference document: CONFORME ISOMÉTRICO		REVISÃO Review: -		FLUIDO: Fluid: -																
METAL BASE Base Metal: AÇO INOX 304L		METAL DE ADIÇÃO Weld Metal: ER308L		PROCESSO DE SOLDAGEM Welding Process: GTAW		CONDIÇÕES SUPERFICIAIS Surface Conditions: ESCOVADA/LIXADA																				
TÉCNICA Method: PHASED ARRAY		APARELHO / NÚMERO DE SÉRIE Instrument / Serial Number: DOPPLER - Flexscan 32/64 PR		ACOPLANTE Coupling: ÁGUA		ESPESSURA Thickness: 3,4 mm																				
CABO COAXIAL Coaxial Handle: 2,5m		BLOCO DE CALIBRAÇÃO Calibration Block: V1		PADRAO DE REFERENCIA Reference Standards: CURVO		SENSIBILIDADE Sensibility: TCG																				
TRANSD./FREQ. (MHz) Transducer/Frequency: 7.5S16-0.5x10		SAPATA Wedge: SD10-N60S-IH	FAIXA DE ÂNGULO Angle Range: 42-70	NÚMERO DE SÉRIE Serial Number: N/A	PITCH/ELEVAÇÃO Pitch/Elevation: 0,5	ELEMENTOS Elements: 16	G. PRINCIPAL Principal Gain: 17,0 dB	G. TRANSF. Transfer Gain: 0	G. VARREDURA Work Gain: 0 dB																	
DETALHE DE INSPEÇÃO Inspection Detail: ☐		LAMINADA Laminate: ☐	FORJADO Forged: ☐	FUNDIDO Casting: ☐	SOLDA Weld: ☒	ATT ☐	PTT ☐	SOLDA Weld: ☐																		
PROCEDIMENTO DE INSPEÇÃO/Rev. Inspection Procedure/Rev.: IT-OB-106 / REV.00					NORMA/CRITÉRIO DE ACEITAÇÃO Code/Acceptance Standards: ASME V / ASME B31.3																					
REGISTROS DE RESULTADOS Register of the Results																										
ISOMÉTRICO/DESENHO	JUNTA	SPOOL	DIAMETRO	DESC.Nº	LOCAL	COMP.	PROF.	SUPERFÍCIE	TIPO DEFEITO	AMPLIT. %	SOLDADOR Welder		LAUDO													
isometric	Joint	Spool	Diameter	Desc.nº	Place	Length	Depth	Surface	Defect Type	Amplit. %	Raiz	Enc./Acab.	Result													
FBK-6-SL-148-S02-NI	002	001	6"	-	-	-	-	-	-	-	P-1802	P-1802	A													
LEGENDA: Legend: A – APROVADO / Approved R – REPROVADO / Rejected REC – RECOMENDADO EXAME COMPLEMENTAR / Recommended Additional Test L1 - LADO 1 / Side 1 L2 - LADO 2 / Side 2 POSI.- POSIÇÃO / Position A.T.T - Antes do tratamento Térmico P.T.T - Pós tratamento térmico																										
OBSERVAÇÕES: Comments:																										
INSPETOR Inspector Reginaldo Ferreira da Silva US-N2-PA / SNQC-03414				APROVAÇÃO Approval PALMONT CONSULTING IND. LTDA Luiz Eduardo de Brito Ferreira Coordenador de Qualidade				CLIENTE / FISCALIZAÇÃO Client / Surveillance																		
DATA / Date: 24/06/26				DATA / Date: 24/04/26				DATA / Date																		




RELATÓRIO DE ENSAIO NÃO DESTRUTIVO
NDT REPORT
ULTRASSOM PHASED ARRAY
PHASED ARRAY ULTRASONIC TEST

END

RELATÓRIO: Report:	US-FAB-PA-160	REVISÃO: Revision:	0	PÁGINA: Page:	02/02	PROGRAMAÇÃO:	-	DATA DE INSPEÇÃO: Inspection Date:	24/06/2026
CLIENTE: Client:	RAIZEN ENERGIA S.A		PROJETO: Project:	E2G - MONTAGEM ELETROMECAÂNICA			Unidade: Unit:	GASA - ANDRADINA - SP	
DESCRIÇÃO: Description:	INSPEÇÃO SOLDAS DE TOPO		DOCUMENTO DE REF: Reference document:			REVISÃO Review		FLUIDO: Fluid.	
			CONFORME ISOMÉTRICO			-		-	

IMAGENS
Images

SPOOL-001 JUNTA-002

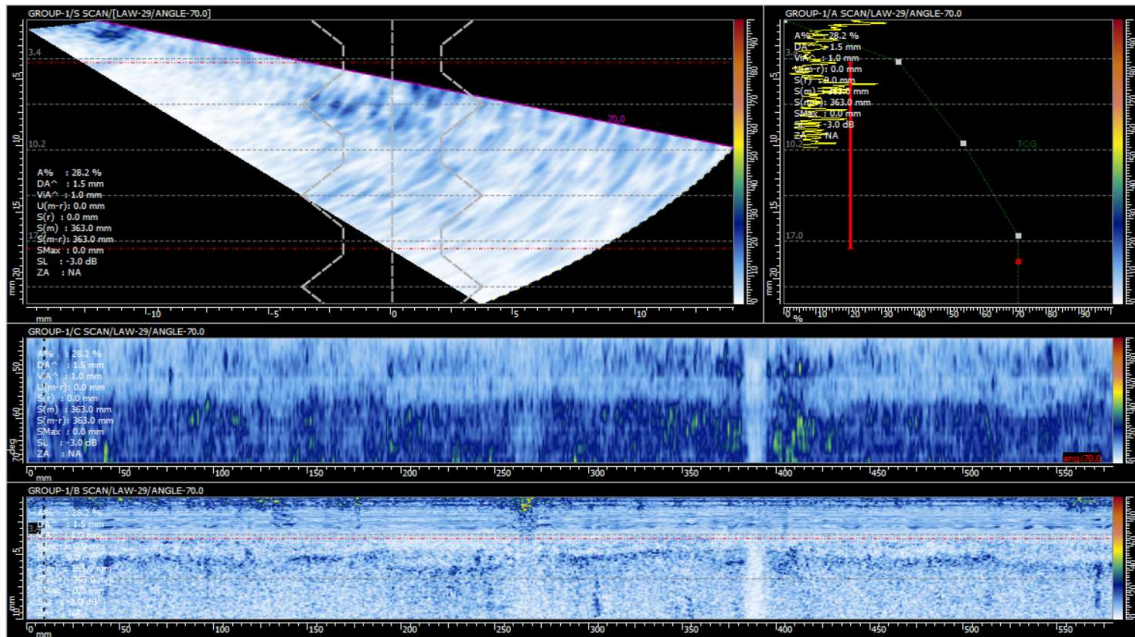

OBSERVAÇÕES:

Comments:	INSPEÇÃO Inspector	APROVAÇÃO Approval	CLIENTE / FISCALIZAÇÃO Client / Surveillance
	Reginaldo Ferreira da Silva US-N2-PA / SNQC-03414	 PALMONT CONST. MONT. IND. LTDA Luis Eduardo de Brito Ferreira Coordenador de Qualidade	
DATA / Date:	24/06/26	DATA / Date:	24/06/26
