PALMONT

RELATÓRIO DE ENSAIO NÃO DESTRUTIVO
NDT REPORT
ULTRASSOM PHASED ARRAY
PHASED ARRAY ULTRASONIC TEST

END

RELATÓRIO: Report:	PA-CS-PALM-05-26	REVISÃO: Revision:	0	PÁGINA: Page:	01/02	PROGRAMAÇÃO: Programing:	-
DATA DE INSPEÇÃO: Inspection Date:	26/06/2026						

CLIENTE: Client:	PROJETO: Project:	Unidade: Unit:
RAIZEN ENERGIA S.A	E2G - MONTAGEM ELETROMECÂNICA	GASA - ANDRADINA - SP

DESCRIÇÃO: Description:	EQUIPAMENTO: Equipment:	TAG: Tag:	DOCUMENTO DE REF: Reference document.	REVISÃO Review	FLUIDO: Fluid.
INSPEÇÃO SOLDAS DE TOPO	-	V22-4-PT-076-CS5-IQ	CONFORME ISOMÉTRICO	-	-

METAL BASE Base Metal	METAL DE ADIÇÃO Weld Metal	PROCESSO DE SOLDAGEM Welding Process	CONDIÇÕES SUPERFICIAIS Surface Conditions
AÇO CARBONO	ER70S-3	GTAW	ESCOVADA/LIXADA
TÉCNICA Method	APARELHO / NÚMERO DE SÉRIE Instrument / Serial Number	ACOPLANTE Coupling	ESPESSURA Thickness
PHASED ARRAY	DOPPLER - Flexscan 32/64 PR	ÁGUA	6.2 mm
CABO COAXIAL Coaxial Handle	BLOCO DE CALIBRAÇÃO Calibration Block	PADRÃO DE REFERÊNCIA Reference Standards	SENSIBILIDADE Sensibility
2,5m	V1	CURVO	TCG

TRANSD./FREQ. (MHz) Transducer/Frequency	SAPATA Wedge	FAIXA DE ÂNGULO Angle Range	NÚMERO DE SÉRIE Serial Number	PITCH/ELEVAÇÃO Pitch/Elevation	ELEMENTOS Elements	G. PRINCIPAL Principal Gain	G. TRANSF. Transfer Gain	G. VARREDURA Work Gain
7.5S16-0.5x10	SD10-N60S-IH	42-70	N/A	0,5	16	24,0 dB	0	0 dB

DETALHE DE INSPEÇÃO Inspection Detail	LAMINADA Laminate	FORJADO Forged	FUNDIDO Casting	SOLDA Weld	A.TT	P.TT	SOLDA Weld
	☐	☐	☐	■	☐	☐	

PROCEDIMENTO DE INSPEÇÃO/Rev. Inspection Procedure/Rev.	NORMA/CRITÉRIO DE ACEITAÇÃO Code/Acceptance Standards
IT-OB-107 / REV.00	ASME V / ASME B31.3

REGISTROS DE RESULTADOS
Register of the Results

ISOMÉTRICO/DESENHO isometric	JUNTA Joint	SPOOL Spool	DIAMETRO Diameter	DESC.N° Desc.n°	LOCAL Place	COMP. Length	PROF. Depth	SUPERFÍCIE Surface	TIPO DEFEITO Defect Type	AMPLIT. % Amplit. %	SOLDADOR Welder Raiz	SOLDADOR Welder Enc./Acab.	LAUDO Result
V22-4-PT-076-CS5-IQ	026NR	006	4"	-	-	-	-	-	-	-	CIS-078	CIS-078	A

LEGENDA:
Legend: A – APROVADO / Approved; R – REPROVADO / Rejected; REC – RECOMENDADO EXAME COMPLEMENTAR / Recommended Additional Test
L1 - LADO 1 / Side 1; L2 - LADO 2 / Side 2; POSI.- POSIÇÃO / Position; A.T.T - Antes do tratamento Térmico; P.T.T - Pós tratamento térmico

OBSERVAÇÕES: **ENSAIOS REALIZADOS PELO INSPETOR PALMONT.**
Comments:

INSPETOR Inspector	APROVAÇÃO Approval	CLIENTE / FISCALIZAÇÃO Client / Surveillance
Rafael da Silva Faria US-N2-PA / ASNT-TC1A N° UT-9092	PALMONT CONST. MONT. IND. LTDA Luiz Eduardo de Brito Ferreira Coordenador de Qualidade	
DATA / Date: 26/06/26	DATA / Date: 26/06/26	DATA / Date

PALMONT	**RELATÓRIO DE ENSAIO NÃO DESTRUTIVO** NDT REPORT **ULTRASSOM PHASED ARRAY** PHASED ARRAY ULTRASONIC TEST	**END**

RELATÓRIO: Report:	**N-PA-CS-PALM-05-26**	REVISÃO: Revision:	**0**	PÁGINA: Page:	**02/02**	PROGRAMAÇÃO:	**-**	DATA DE INSPEÇÃO: Inspection Date:	**26/06/2026**

CLIENTE: Client:	PROJETO: Project:	Unidade: Unit:
RAIZEN ENERGIA S.A	**E2G - MONTAGEM ELETROMECÂNICA**	**GASA - ANDRADINA - SP**

DESCRIÇÃO: Description:	DOCUMENTO DE REF: Reference document.	REVISÃO Review	FLUIDO: Fluid.
INSPEÇÃO SOLDAS DE TOPO	**CONFORME ISOMÉTRICO**	**-**	**-**

IMAGENS
Images

SPOOL-006 JUNTA-026NR

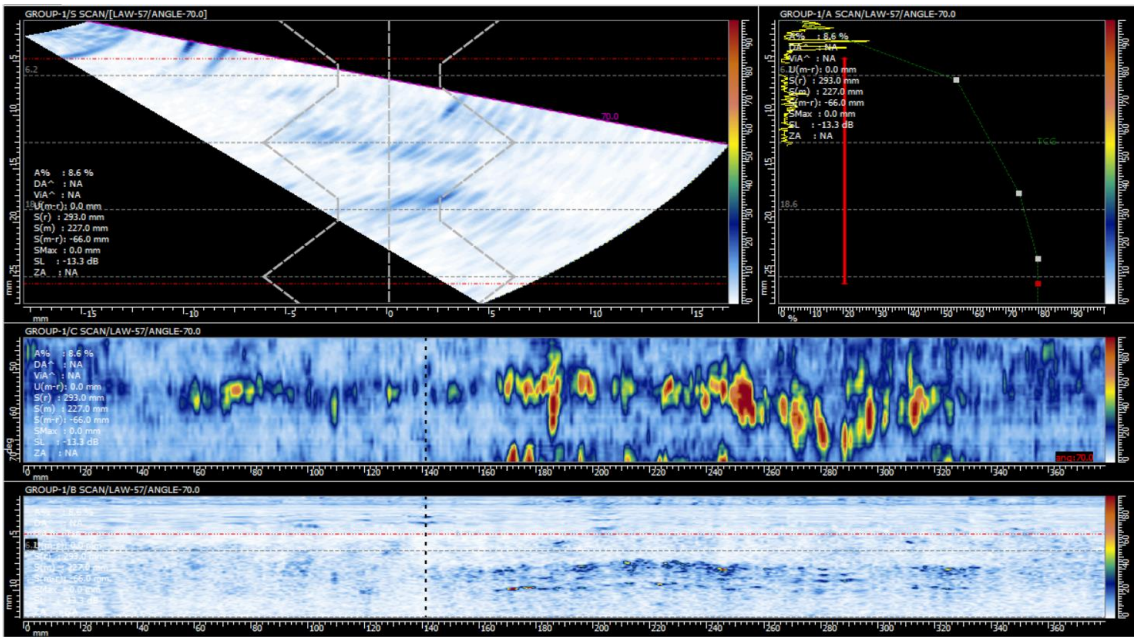

OBSERVAÇÕES:
Comments:

INSPETOR Inspector	APROVAÇÃO Approval	CLIENTE / FISCALIZAÇÃO Client / Surveillance
Rafael da Silva Faria *US-N2-PA / ASNT-TC1A N° UT-9092*	PALMONT CONSTRUTORA MONT. IND. LTDA *Luiz Eduardo de Brito Ferreira* Coordenador de Qualidade	
DATA / Date: **26/06/26**	DATA / Date: **26/06/2026**	DATA / Date
